ALLEGATO "A"

Comune di Lecce
Provincia di LE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Parco Urbano dell'ex Presidio Ospedaliero "Galateo" tra Via Malta, Via Camassa e Viale Rossini
COMMITTENTE: PUGLIA VALORE IMMOBILIARE S.R.L..

CANTIERE: Via Malta, Via Camassa e Viale Rossini, Lecce (LE)

Lecce, 01/06/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Dott. Ing. Edmondo SCRIMIERI N° 999 Sezione A - Settore: Civile Ambientale Industriale Informazione

(Ingegnere Scrimieri Edmondo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

L'Amministratore Unico Puglia Valore Immobiliare

(AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE BALDUCCI CATALDO)

Ingegnere Scrimieri Edmondo
Via Manfredi,12
73100 Lecce (le)
Tel.: 0832/308809 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: edmondo.scrimieri@tin.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE						
Preparazione delle aree di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	04/12/2017	05/12/2017
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	2	2	04/12/2017	05/12/2017
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	2	2	04/12/2017	05/12/2017
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	E	2	2	04/12/2017	05/12/2017
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	E	2	2	04/12/2017	05/12/2017
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	06/12/2017	06/12/2017
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	06/12/2017	06/12/2017
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	06/12/2017	06/12/2017
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	06/12/2017	06/12/2017
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	07/12/2017	07/12/2017
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	07/12/2017	07/12/2017
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	07/12/2017	07/12/2017
LAVORI STRADALI						
Demolizione marciapiede e recinzione esistenti						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	3	3	05/12/2017	07/12/2017
Rimozione di cordoli	1	E	3	6	06/12/2017	11/12/2017
Demolizione recinzione esistente	1	E	5	8	06/12/2017	13/12/2017
Parcheggi e marciapiedi						
Formazione di rilevato stradale	1	E	5	5	11/12/2017	15/12/2017
Ripristino di manto di usura	1	E	3	3	11/12/2017	13/12/2017
Realizzazione di marciapiedi e parcheggi	1	E	7	9	11/12/2017	19/12/2017
LAVORI MOVIMENTO TERRA						
Tracciamenti e risezionamenti						
Tracciamento dell'asse di scavo	1	E	1	1	11/12/2017	11/12/2017
Scavi di scoticamento						
Scoticamento	1	E	5	7	12/12/2017	18/12/2017
Scavi a sezione obbligata						
Scavo a sezione obbligata	1	E	6	8	15/12/2017	22/12/2017
Pali trivellati						
Perforazioni per pali trivellati	1	E	4	8	20/12/2017	27/12/2017
CEMENTO ARMATO						
Pali trivellati						
Posa ferri di armatura per pali trivellati	1	E	1	1	27/12/2017	27/12/2017
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	1	E	2	2	27/12/2017	28/12/2017
Strutture in fondazione in c.a.						

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	5	8	29/12/2017	05/01/2018
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	2	2	02/01/2018	03/01/2018
Strutture in elevazione in c.a.						
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	E	3	3	02/01/2018	04/01/2018
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	E	2	2	04/01/2018	05/01/2018
Strutture in elevazione in muratura						
Realizzazione di murature in elevazione	1	E	7	11	05/01/2018	15/01/2018
IMPIANTI A RETE						
Opere d'arte						
Serbatoio per ricircolo acqua fontana	1	E	2	2	08/01/2018	09/01/2018
Pozzetti di ispezione	1	E	2	2	08/01/2018	09/01/2018
Impianti a rete						
Posa di conduttura elettrica	1	E	11	15	03/01/2018	17/01/2018
	1	E	15	19	22/01/2018	09/02/2018
Posa di conduttura idrica	1	E	10	12	08/01/2018	19/01/2018
Realizzazione quadro elettrico esterno	1	E	8	12	18/01/2018	29/01/2018
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE						
Posa di conduttura per irrigazione	1	E	8	10	16/01/2018	25/01/2018
RIEMPIMENTI						
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	3	3	29/01/2018	31/01/2018
Formazione rilevati	1	E	4	4	06/02/2018	09/02/2018
	1	E	3	3	26/02/2018	28/02/2018
PAVIMENTAZIONI						
Massetti e sottofondi						
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1	E	6	8	22/01/2018	29/01/2018
Pavimentazioni						
Realizzazione di pavimentazione industriale fotocatalitica	1	E	7	9	29/01/2018	06/02/2018
Realizzazione di pavimentazione in terra solida	1	E	15	19	29/01/2018	16/02/2018
Posa di pavimenti per esterni in gres porcellanato	1	E	3	3	19/02/2018	21/02/2018
Realizzazione di pavimentazione sintetica in gomma	1	E	8	10	19/02/2018	28/02/2018
Posa di pavimenti per interni in gres porcellanato	1	E	3	3	19/02/2018	21/02/2018
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI						
Formazione di terreno agrario	1	E	4	6	21/02/2018	26/02/2018
Formazione di tappeto erboso	1	E	8	10	21/02/2018	02/03/2018
Messa a dimora di piante	1	E	8	10	21/02/2018	02/03/2018
REALIZZAZIONE TAMPONATURE ESTERNE						
Realizzazione di tamponature	1	E	2	2	12/02/2018	13/02/2018
REALIZZAZIONE SOLAIO IN C.A. CORPO SERVIZI						
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	1	E	2	2	14/02/2018	15/02/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato	1	E	2	2	14/02/2018	15/02/2018
LEGNO LAMELLARE						
Coperture in legno lamellare						
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare	1	E	5	7	15/02/2018	21/02/2018
Montaggio di arcarecci in legno lamellare	1	E	5	5	19/02/2018	23/02/2018
Strutture principali in legno lamellare						

Montaggio travi in legno lamellare	1	E	5	5	19/02/2018	23/02/2018
INFISSI ESTERNI						
Montaggio di serramenti esterni	1	E	4	4	26/02/2018	01/03/2018
PARETI DIVISORIE						
Realizzazione di partizioni interne	1	E	5	7	21/02/2018	27/02/2018
IMPIANTO ELETTRICO						
Realizzazione di impianto di messa a terra	1	E	2	2	01/03/2018	02/03/2018
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	33	45	22/01/2018	07/03/2018
IMPIANTO IDRICO - SANITARIO CORPO SERVIZI						
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	1	E	2	2	01/03/2018	02/03/2018
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	1	E	1	1	16/03/2018	16/03/2018
IMPIANTO FOGNARIO CORPO SERVIZI						
Posa di conduttura fognaria	1	E	3	5	01/03/2018	05/03/2018
INTONACI E PITTURAZIONI INTERNE						
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	4	4	05/03/2018	08/03/2018
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	3	5	09/03/2018	13/03/2018
RIVESTIMENTI INTERNI						
Posa di rivestimenti interni in ceramica	1	E	3	3	12/03/2018	14/03/2018
SERRAMENTI INTERNI						
Montaggio di porte interne	1	E	4	4	13/03/2018	16/03/2018
INTONACI E PITTURAZIONI ESTERNE						
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	E	3	3	14/03/2018	16/03/2018
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	2	2	19/03/2018	20/03/2018
ARREDO URBANO						
Posa recinzione	1	E	12	16	05/03/2018	20/03/2018
Posa cestini e portabici	1	E	2	2	07/03/2018	08/03/2018
Posa giochi	1	E	8	10	07/03/2018	16/03/2018
Posa attrezzature percorso benessere	1	E	9	13	07/03/2018	19/03/2018
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	E	9	13	07/03/2018	19/03/2018
SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	20/03/2018	21/03/2018

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
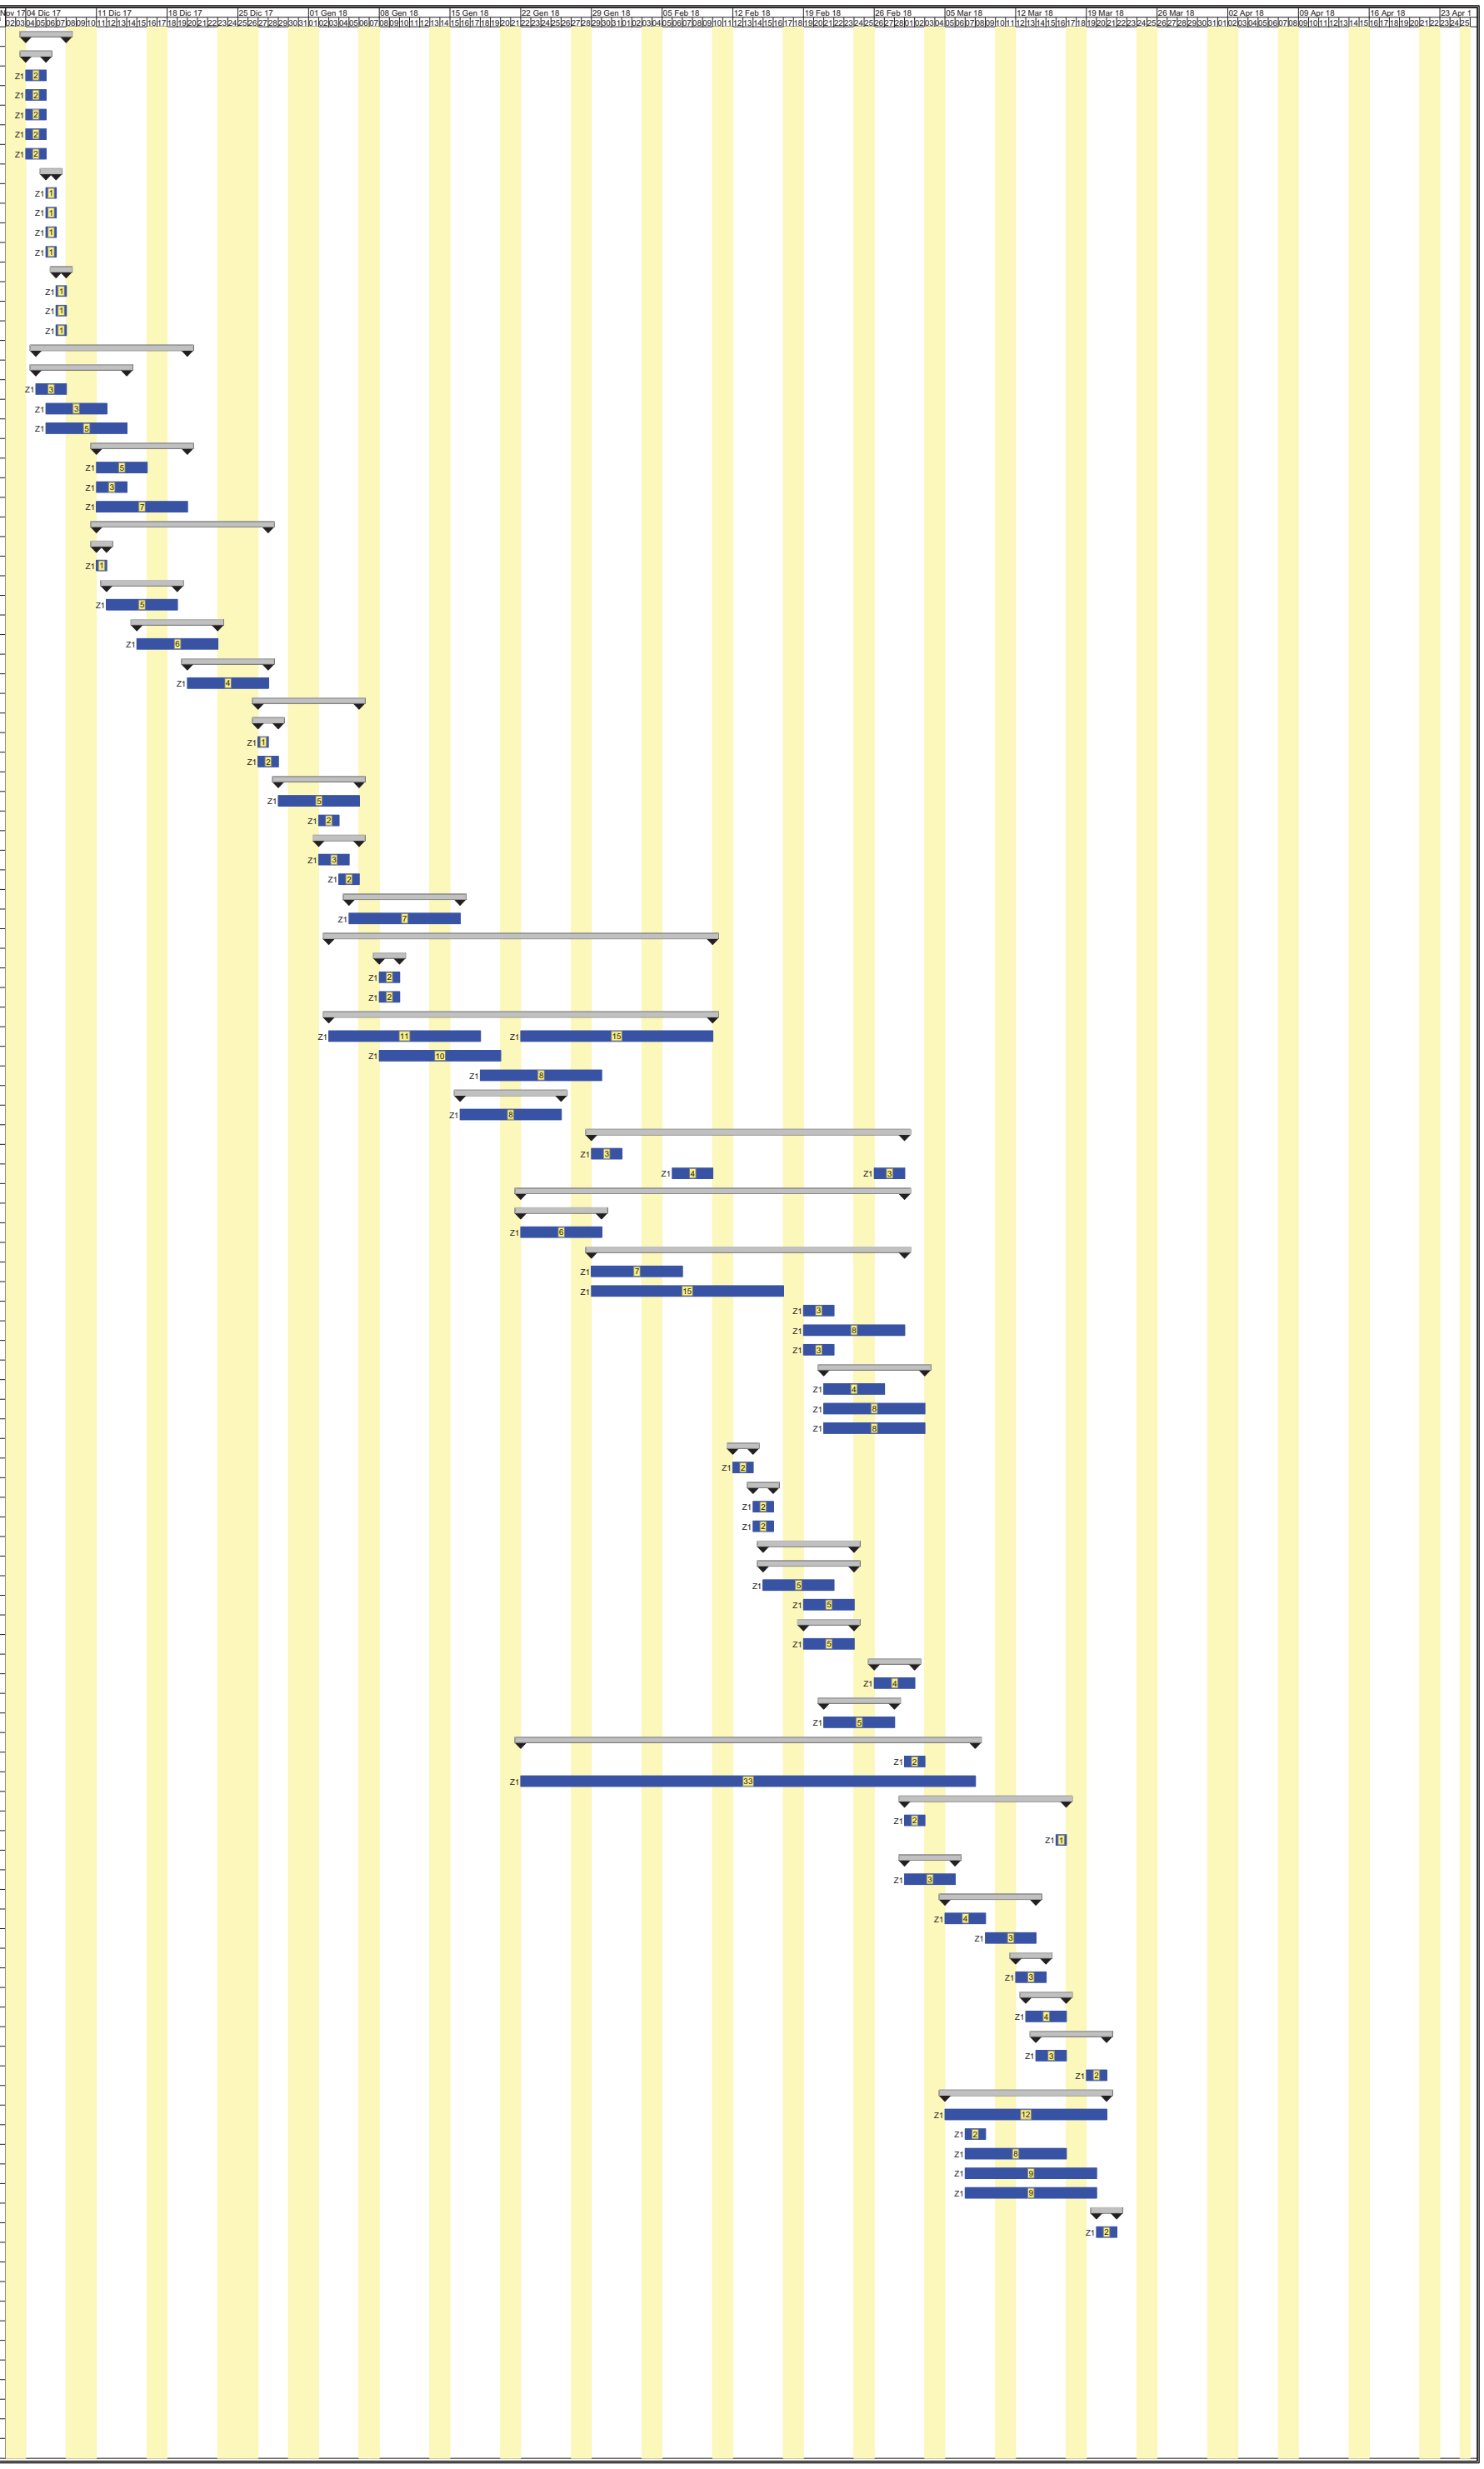
Nome attività	Durata
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	4 g
Preparazione delle aree di cantiere	2 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier	2 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	2 g
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2 g
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	2 g
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	2 g
Apprestamenti del cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat	1 g
Impianti di servizio del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assi	1 g
LAVORI STRADALI	10 g
Demolizione marciapiede e recinzione esistenti	6 g
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	3 g
Rimozione di cordoli	3 g
Demolizione recinzione esistente	5 g
Parcheggi e marciapiedi	7 g
Formazione di rilevato stradale	5 g
Ripristino di manto di usura	3 g
Realizzazione di marciapiedi e parcheggi	7 g
LAVORI MOVIMENTO TERRA	11 g
Tracciamenti e risezionamenti	1 g
Tracciamento dell'asse di scavo	1 g
Scavi di scoticamento	5 g
Scoticamento	5 g
Scavi a sezione obbligata	6 g
Scavo a sezione obbligata	6 g
Pali trivellati	4 g
Perforazioni per pali trivellati	4 g
CEMENTO ARMATO	7 g
Pali trivellati	2 g
Posa ferri di armatura per pali trivellati	1 g
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	2 g
Strutture in fondazione in c.a.	5 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in f	5 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	2 g
Strutture in elevazione in c.a.	4 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in e	3 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	2 g
Strutture in elevazione in muratura	7 g
Realizzazione di murature in elevazione	7 g
IMPIANTI A RETE	28 g
Opere d'arte	2 g
Serbatoio per ricircolo acqua fontana	2 g
Pozzetti di ispezione	2 g
Impianti a rete	28 g
Posa di conduttura elettrica	26 g
Posa di conduttura idrica	10 g
Realizzazione quadro elettrico esterno	8 g
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	8 g
Posa di conduttura per irrigazione	8 g
RIEMPIMENTI	23 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	3 g
Formazione rilevati	7 g
PAVIMENTAZIONI	28 g
Massetti e sottofondi	6 g
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	6 g
Pavimentazioni	23 g
Realizzazione di pavimentazione industriale fotocatalitic	7 g
Realizzazione di pavimentazione in terra solida	15 g
Posa di pavimenti per esterni in gres porcellanato	3 g
Realizzazione di pavimentazione sintetica in gomma	8 g
Posa di pavimenti per interni in gres porcellanato	3 g
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI	8 g
Formazione di terreno agrario	4 g
Formazione di tappeto erboso	8 g
Messa a dimora di piante	8 g
REALIZZAZIONE TAMPONATURE ESTERNE	2 g
Realizzazione di tamponature	2 g
REALIZZAZIONE SOLAIO IN C.A. CORPO SERVIZI	2 g
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	2 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefa	2 g
LEGNO LAMELLARE	7 g
Coperture in legno lamellare	7 g
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare	5 g
Montaggio di arcarecci in legno lamellare	5 g
Strutture principali in legno lamellare	5 g
Montaggio travi in legno lamellare	5 g
INFISSI ESTERNI	4 g
Montaggio di serramenti esterni	4 g
PARETI DIVISORIE	5 g
Realizzazione di partizioni interne	5 g
IMPIANTO ELETTRICO	33 g
Realizzazione di impianto di messa a terra	2 g
Realizzazione di impianto elettrico	33 g
IMPIANTO IDRICO - SANITARIO CORPO SERVIZI	12 g
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-san	2 g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	1 g
IMPIANTO FOGNARIO CORPO SERVIZI	3 g
Posa di conduttura fognaria	3 g
INTONACI E PITTURAZIONI INTERNE	7 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	4 g
Tinteggiatura di superfici interne	3 g
RIVESTIMENTI INTERNI	3 g
Posa di rivestimenti interni in ceramica	3 g
SERRAMENTI INTERNI	4 g
Montaggio di porte interne	4 g
INTONACI E PITTURAZIONI ESTERNE	5 g
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	3 g
Tinteggiatura di superfici esterne	2 g
ARREDO URBANO	12 g
Posa recinzione	12 g
Posa cestini e portabici	2 g
Posa giochi	8 g
Posa attrezzature percorso benessere	9 g
Posa di pali per pubblica illuminazione	9 g
SMOBILIZZO DEL CANTIERE	2 g
Smobilizzo del cantiere	2 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA
